


ОТЧЕТ

О выполнении плана текущего ремонта в натуральных показателях на штукатуров,
маляров за сентябрь 2011 год по ЖК «САЛАВАТ».

№	Наименование работ	Ед. изм.	За III-квартал план	За квартал выпол.	% выполнения	С начала года план	С начала года выпол.	% выполнения
1	Проф.осмотр штукатурки и фасада	1000 кв/м	106	106	100	212	212	100
2	Ремонт штукатурки стен	м/кв	66,5	66,5	100	110	102,4	93
3	Перетирка штукатурки стен и потолков	м/кв	136	136	100	3700	2166,5	59
4	Акриловая окраска стен и потолков	м/кв				4604	3336,50	72
5	Масляная окраска стен за 2 раза	м/кв	446	446	100	3114	2220	71
6	Масляная окраска окон с 3-х сторон	м/кв	44	44	100	359	321,91	87
7	Масляная окраска перил	м/кв	-			148	68	46
8	Масляная окраска огражден. л/клетки	м/кв	-			248	180	72
9	Масляная окраска торцов л/маршей	м/кв	-			106	76	71
10	Масляная окраска эл. щ. почтовых ящиков	м/кв	-			97	67	69
11	Масляная окраска труб и радиат. на л/клетке	м/кв	7	7	100	61	50,2	82
12	Масляная окраска дверей	м/кв	86	86	100	190	146	76
13	Масляная окраска скамеек	м/кв	309	309	100	347	347	100
14	Масляная окраска МАФ	м/кв	774	774	100	870	870	100
15	Масляная окраска плинтусов	м/кв	-			161	96	60
16	Ремонт штукатурки стен, мусорокамер	м/кв	114	114	100	114	114	100
17	Масляная окраска стен мусорокамер	м/кв	175	177,4	101	175	177,45	101
18	Акрилов.окраска стен и потолка мусорокамер	м/кв	200	200	100	200	200	100
19	Ремонт штукатурки откосов	кв.м	57	57	100	57	57	100
20	Ремонт штукатурки цоколя	кв.м	228	228	100	228	228	100
21	Ремонт цементных полов	кв.м	39	39	100	39	39	100
22	Масляная окраска мет.решеток	кв.м	20	20	20	20	20	100

23	Покраска цветочниц	кв.м	25	25	100	25	25	100
24	Покраска цоколя (акр.)	кв.м	2300	2378	103	2300	2378	103
25	Ремонт межпанельных швов	кв.м	121	121	100	121	121	100
				план	вып			
	Осмотры			224	224			
	Тек.ремонт			480	502			
	Н.ремонт			120	120			

Мастер текущего ремонта:

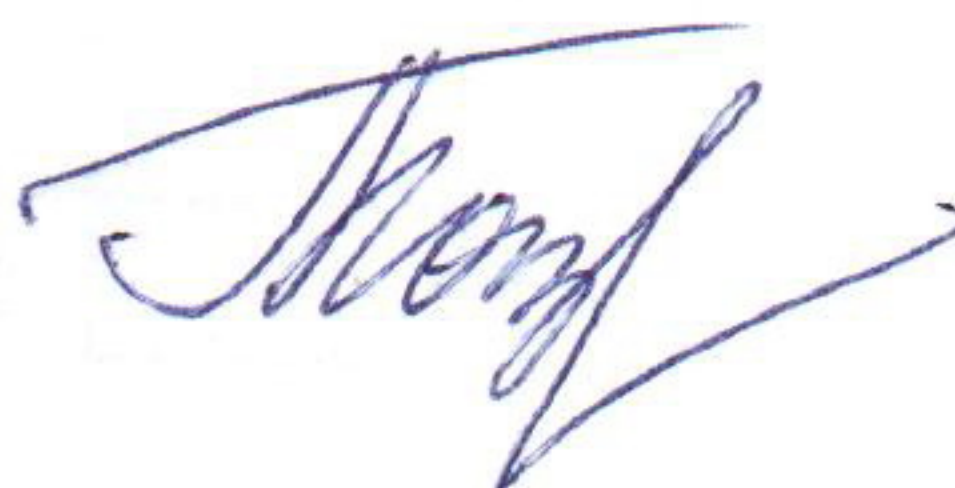

Т.А.Кожурова.

